



**AB Storstockholms Lokaltrafik**  
Planering  
Maria Ljung, tfn 08-6861427  
Miljöfrågor

Datum  
2004-09-29  
Ert datum

*Bilaga 3*


Vår beteckning  
SL-2004-1707  
Ert beteckning

Stockholms Läns Landsting  
Landstingsstyrelsen  
Box 22550  
104 22 Stockholm

### Ansökan om uppskov för miljöledningssystem

Härmed inkommer AB Storstockholms Lokaltrafik (AB SL) med ansökan om uppskov för införande av miljöledningssystem enligt ISO 14001. Kravet på införande av miljöledningssystem har ställts i samband med Stockholms Läns Landstings miljöpolitiska program för 2002-2006. Arbetet bedrivs inom AB SL i enlighet med bifogad projektplan och för att intensifiera arbetet har en projektledare för uppdraget projekterats under perioden maj 2004 till maj 2006. Arbetet med införande av certifierat miljöledningssystem slutredovisas 2005-12-31.

Med vänliga hälsningar



Lars Nordstrand  
Chef Affärsenheten

Bilaga Projektplan



Dokumentbeteckning

Dokumentnamn

Sida

Upprättad av

Projektplan för införande av miljöledningssystem

1 (3)

Maria Ljung

Granskad och godkänd av

Giltig från

Utgåva

2004-09-07

1

## PROJEKTPLAN FÖR: INFÖRANDE AV MILJÖLEDNINGSSYSTEM OCH CERTIFIERING ENLIGT ISO/DIS 14001

*Projektnummer: 268077*

### Syfte och innehåll

SL har i uppdrag av Stockholms Läns Landstings att införa ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001. Införandet av miljöledningssystem enligt ISO/DIS 14001 är även ett miljömål beslutat av SL:s ledning.

Intent på SL är främsta drivkraften för att införa ett miljöledningssystem en tydlig ansvar fördelning och struktur för arbetet med miljöfrågorna. Ett miljöledningssystem genererar dessutom en kontroll av efterlevnad av aktuell lagstiftning och är ett verktyg för att säkerställa att miljöarbetet genomförs på ett systematiskt och effektivt sätt. Miljöledningssystemet syftar till att generera minskad miljöbelastning från verksamheten samtidigt som det skapar förutsättningar för ledningens uppföljning och kontroll av miljöarbetets resultat och kostnader.

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) har i det av styrelsen beslutade miljöprogrammet "Program för ett hållbart resande med SL" angivit att SL ska ha ett aktivt miljöarbete, både praktiskt och kommunikativt. SL:s målsättning är att bli ett miljömässigt föredöme för allmänhet, politiker och företag. Detta ligger i linje med de ägarkrav som återfinns i Stockholms läns landstings (SLLs) miljöprogram.

### Avgränsningar

Projektet innebär att införa miljöledningssystem som är certifieringsbart enligt ISO 14001 för AB Storstockholms Lokaltrafik (moderbolaget) och SL Infrateknik som är dotterbolag. Miljöledningssystemet skall fokusera på processerna upphandling av trafik, förvaltning och utveckling av fastigheter, fordon och bana som medför den mest betydande miljöbelastningen. Arbetsmiljöfrågor berörs endast i den mån de även ingår som del i större miljöpåverkan.

### Metod

Tonvikten i miljöledningsarbetet läggs på indirekt miljöpåverkan d v s där SL har störst möjlighet att åstadkomma långsiktiga betydelsefulla förbättringar.



Dokumentbeteckning

Dokumentnamn

Sida

Projektplan för införande av miljöledningssystem

2 (3)

Upprättad av

Granskad och godkänd av

Giltig från

Utgåva

Marie Ljung

2004-09-07


1

Viktiga nyckelparametrar för att projektet skall lyckas har identifierats enligt nedan:

- Ledningens engagemang
- Bygga på miljöarbetet som redan bedrivs
- Delegera det straffrättsliga ansvaret i organisationen
- Utbilda projektdeltagare i miljöledningssystem
- Informera alla medarbetare om projektet via olika media
- Engagera och utnyttja extern kompetens och erfarenhet
- Integrera miljöledningssystemet i vårt befintliga arbetssätt

### Projektorganisation

Projektgruppen består av Maria Ljung (Moderbolaget), Johan Ohlsson (SL Infrateknik) och Kristian Rostlund. Därutöver finns lokala representanter utsedda för respektive avdelning som skall fungera som referensgrupp. Miljöstyrgruppen är beställare av miljöledningssystemet och har ledningens mandat/uppdrag att besluta om miljöledningssystemet.

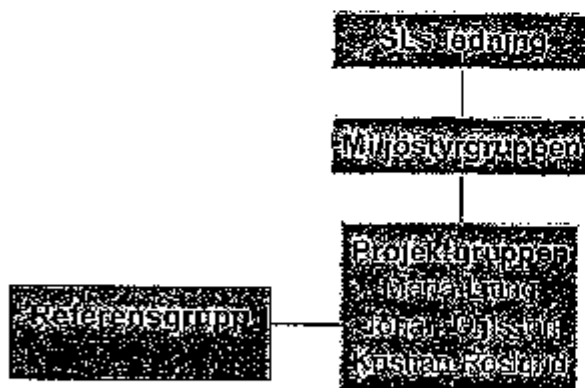

Referensgruppen består av:

- Representant LA
- Representant IR
- Representant IF
- Representant IB
- Kenneth Blre, Kontrakt
- Ulla Lundell, Kansli
- Christer Lindeman, Säkerhet
- Gumilla Rosenqvist, SPAN
- Jan Svensson, Kommunikation
- Ulla Norén, Försäljning
- Eric Tedesjö, AP



Dokumentbeteckning

Dokumentnamn

Sida

Upprättad av

Projektplan för införande av miljöledningssystem

3 (3)

Maria Ljung

Granskad och godkänd av

Giltig från

Utgåva

2004-09-07

1

## Tidplan

En detaljerad tidplan finns presenterad i bilaga 1.

## Total budget

Kostnader för arbetstid vad avser referensgrupp, miljöstyrgrupp, samt projektgrupp tas inom befintliga ramar. Därutöver tillkommer kostnader för utbildning av all personal, konsultarvoden samt materialkostnader. Totalt omfattar projektet ca 1 000 000 kronor fördelade över 2 års tid.

## Utvärdering/ uppföljning

Arbetet med miljöledningssystem skall följas upp, utvärderas, redovisas och på sikt revideras. Avsikten är att efter redovisning och utvärdering av miljöarbetet, kontinuerligt höja ambitionsnivån och sätta nya mål för det fortsatta arbetet.

Projektplanens godkännande:

Projektledare: <i>Maria Ljung</i>	Datum: <i>2004-09-29</i>
Namnförtydligande: <i>Maria Ljung</i>	



Dokumentbeteckning

Upprättad av

Maria Ljung

Dokumentnamn

Tidplan för införande av miljöledningssystem

Granskad och godkänd av

Giltig från

2004-09-07

Sida

1 (3)

Utgåva

1

## Tidplan för införande av miljöledningssystem och certifiering

### Aktivitet

### Tid

Planering / omfattning definition	2004-08-20
Miljöaspekter förtecknade och prioriterade	2004-08-20
Miljöledningssystemets struktur, utformning	2004-09-01
Fördiskussion 1 med certifieringsorganet	2004-11-15
Rutiner för miljöarbetet map:	2004-12-20
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagar</li> <li>• Miljöaspekter</li> <li>• Utbildning</li> <li>• Kommunikation</li> <li>• Nödlägen</li> <li>• Revision</li> </ul>	
Utbildning planerad inklusive analys, behov omfattning	2005-01-25
Stor miljöutbildning	2005-02/03
Fördiskussion 2 med certifieringsorganet	2005-02-25
Riktade utbildning	2005-(03-05)
Förrevision	2005-06
Extern revision	2005-12
6 månaders revisioner	2006-06
Slutrapport	2006 Q3-Q4
